
ILL Watch

FEUILLE DE ROUTE · VERSION 2.0

Jalons, critères et prochaines étapes

Où en est le projet, ce qui est constaté, ce qui est livré, ce qui reste à faire dans l'ordre jusqu'à la version 0.2.0, puis la suite.

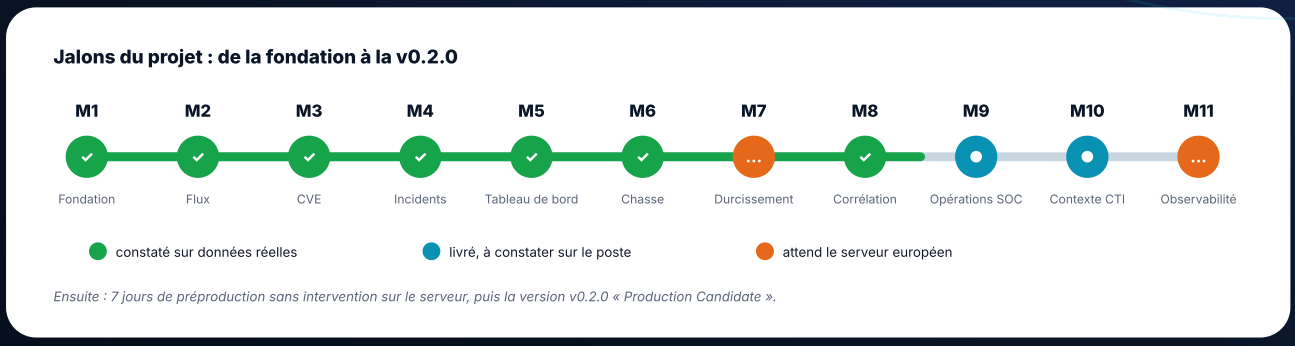

VERSION
2.0 · 30 octobre 2026

LOGICIEL
ILLWATCH 0.2.0.dev0

AUTEUR
Godwill FOKA · CyberillSec, une initiative CYBERILL

POUR QUI
Équipe projet, pilotage, contributeurs

Sommaire

1 1. Où en est le projet 1

2 2. Jalons M1 à M6 : la plateforme fonctionnelle 2

3 3. Jalons M7 à M11 : vers la v0.2.0 2

4 4. Ce qui reste à faire, dans l'ordre 4


5 5. Après la v0.2.0 4

6 6. Calendrier 5

Version en ligne, toujours à jour : https://godwillfoka.github.io/cyberillsec-illwatch/
Les numéros de page renvoient au pied de page du document.

Version	**v2.0 du 30/10/2026**
Version du logiciel	`0.2.0.dev0` sur `main` ; dernière release `v0.1.1` (baseline M1 à M6)
Objectif	v0.2.0 « Production Candidate », puis la suite décrite en section 5

Règle de conduite. Un jalon est clos quand ses **critères de sortie sont constatés**, pas quand le code est fusionné. Chaque jalon part d'une branche créée depuis `main` et se termine par un bilan dans `Rapport/` et, pour les versions, un tag.

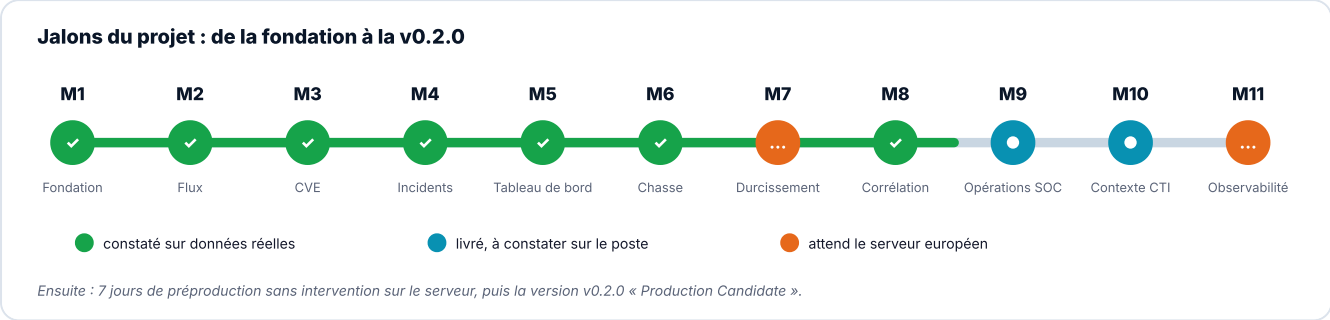

1. Où en est le projet

	État au 30/10/2026
Constaté sur données réelles	M1 à M6, M8 ; scénario SOC 48/48 ; 528 453 IOC et 26 416 CVE sur le poste de travail
Livré, à constater sur le poste	M9 (opérations SOC), M10 (contexte adverse) ; import d'inventaire Excel (ADR-028)
Livré, attend le serveur européen	M7 (HTTPS sur domaine public, note SSL Labs), M11 (7 jours de préproduction)
Qualité	deux pipelines CI (GitLab, GitHub), plus de 670 tests, couverture d'environ 94 %, validation sur données réelles chaque lundi, préproduction et captures à chaque modification
Documentation	guide d'installation, manuel fonctionnel, cahier des charges, vision et feuille de route en version 2.0 ; 28 ADR



Le 06/10, les clés OTX, abuse.ch et TAXII ont été ajoutées ; le 08/10, l'historique OTX a été entièrement lu (334 311 IOC actifs).

2. Jalons M1 à M6 : la plateforme fonctionnelle

Jalon	Contenu	Critère de sortie	État
M1 Fondation	configuration validée, migrations, comptes, rôles, CLI	schéma, API, rôles, audit	✅ constaté
M2 Flux de menaces	5 formats, 9 sources, dédoublonnage, provenance, worker	au moins 500 IOC, 3 sources saines, OTX et STIX connectés	✅ constaté le 06/10
M3 Moteur CVE	NVD, KEV, EPSS, score composite, alertes	NVD de moins de 24 h, KEV de plus de 1 000, EPSS de plus de 90 %	✅ constaté le 06/10
M4 Incidents	cycle NIST à 6 états, chronologie immuable	un incident mené jusqu'à la clôture	✅ constaté
M5 Tableau de bord	synthèse, activité, exports	scénario SOC	✅ constaté
M6 Chasse	6 règles, sessions	session terminée avec correspondances	✅ constaté (339 en CI)

Release `v0.1.1` publiée le 06/10/2026 (image `ghcr.io/godwillfoka/cyberillsec-illwatch:0.1.1`).

3. Jalons M7 à M11 : vers la v0.2.0

Le test d'acceptation de la v0.2.0 suit un parcours complet : source de renseignement, ingestion, normalisation, enrichissement, corrélation, détection, alerte, incident, investigation, chasse, ATT&CK, tableau de bord, résolution, piste d'audit. Il est automatisé par `scripts/scenario_soc.py` et rejoué en CI.

M7 : Durcissement de production

But. Rendre ILLWATCH déployable sans réserve de sécurité connue.

Lot	Contenu	État
1	audit en ajout seul, `/ready`, en-têtes HTTP, identifiant de requête, verrouillage compte × adresse, sauvegarde et restauration	✅ constaté le 03/10
2	rôles PostgreSQL séparés, Redis protégé, rotation de clé, sessions révocables	✅ constaté le 04/10
3	Caddy (HTTPS), analyse d'image, migrations éphémères, entretien quotidien	✅ TLS constaté en local ; outillage `deploy-vps.sh` prêt
Interface (ADR-016)	12 écrans temps réel, identité ILL Watch v2, 5 langues	✅ utilisée sur données réelles
Inventaire en fichier (ADR-028)	import et export Excel ou CSV, aperçu, tout ou rien	🟢 livré le 30/10
Rédaction	ni tiret long ni tiret moyen, garde-fou en CI	🟢 livré le 30/10

Critère de sortie : pile de production sur un serveur européen, note SSL Labs A ou mieux (workflow « Clôture M7 »). **Reste** : louer le serveur et le nom de domaine.

M8 : Détection et corrélation

Confiance des IOC (ADR-017), enrichissement hors ligne (ADR-019), inventaire et corrélation CORR-01 à 03 (ADR-020), comparaison des versions (ADR-021), plages CIDR, plateforme de l'actif, calibration DGA sur Tranco. **Critère** : 100 % des cas attendus détectés sur jeu figé, taux de faux positifs publié. ✅ **Clos le 14/10/2026** : 100 % détectés, 0 % de faux positifs ; sur données réelles, 38 évènements de la première passe, 37 clos par la comparaison des versions.

M9 : Opérations SOC

Niveaux L1, L2, L3 et escalade, liste d'exclusion des faux positifs, chasse depuis l'incident, recommandations de réponse, règles versionnées, écran Pilotage (ADR-022). **Critère** : un incident traverse L1, L2 et L3 sans quitter ILLWATCH, MTTR mesuré. 🟢 **Constaté en CI** ; à rejouer sur le poste.

M10 : Contexte adverse

Référentiel MITRE ATT&CK (ADR-023), campagnes et attribution par l'infrastructure (ADR-024), export STIX 2.1 et serveur TAXII 2.1 (ADR-025). **Critère** : une alerte affiche sa technique ATT&CK et, si connu, l'acteur. 🟢 **Constaté en CI** ; à constater sur le poste après `illwatch attack import`.

M11 : Observabilité et déploiement

`/metrics`, Prometheus et Grafana (10 alertes, 2 tableaux), acceptation en CI sur jeu figé, restauration testée chaque mois, environnements de développement, préproduction et production (ADR-026). **Critère** :

7 jours de collecte continue en préproduction sans intervention, tableaux complets, restauration testée. **Reste** : les 7 jours, sur le serveur de M7.

4. Ce qui reste à faire, dans l'ordre

#	Tâche	Qui	Dépend de	Effort
1	Relire et fusionner la demande de fusion « Inventaire Excel/CSV, ponctuation, documentation v2 »	porteur	CI verte	1 h
2	Sur le poste : `git pull`, `pip install -c constraints.txt -e ".[dev]"`, `illwatch db upgrade`, `./scripts/build-web.sh`, `illwatch attack import`, redémarrer API et worker	porteur	1	30 min
3	Déclarer l'inventaire réel avec le modèle Excel, puis `illwatch cves refresh-affected` et `illwatch correlate run`	porteur	2	1 à 2 h
4	Constater M9 (escalade L1 à L3, Pilotage) et M10 (ATT&CK, campagne, `curl /taxii2/`) sur le poste ; rédiger les bilans	porteur	2	2 h
5	Suspendre RedEye tant que son serveur ne répond pas ; régler le fuseau horaire de la machine virtuelle	porteur		15 min
6	Louer un serveur européen (2 cœurs, 4 Go, 40 Go) et un nom de domaine ; `deploy-vps.sh install` ; inscrire le domaine dans `deploy/vps-domaine.txt`	porteur		2 h
7	Constater la note TLS (workflow « Clôture M7 ») : **M7 clos**	CI	6	automatique
8	7 jours de préproduction sans intervention, restauration du mois : **M11 clos**	serveur	6	7 jours
9	Tag `v0.2.0`, release, image publiée	porteur	7, 8	1 h

5. Après la v0.2.0

Thème	Contenu	Priorité
Multi-organisation et SSO	plusieurs organisations sur une instance, OIDC	haute
Cyberill TI Cloud	offre hébergée dans l'UE	haute
Assistant d'analyse	modèle de langage et recherche augmentée sur bulletins et incidents	moyenne
Connecteurs de parc	GLPI, CMDB, pour l'inventaire	moyenne
Règles Sigma	import depuis les collections TAXII	moyenne

Thème	Contenu	Priorité
Facteur CWE dans le score	ADR à rédiger, rééquilibrage des poids	basse
Site de présentation	relecture native des 5 langues, mentions légales, hébergement à côté de l'application	moyenne

6. Calendrier

Période	Jalons
juillet à septembre 2026	cadrage, cahier des charges, M1 à M6
03/10 au 06/10/2026	audit global, M7 lots 1 à 3, release `v0.1.1`, M2 et M3 constatés
08/10/2026	renommage SENTRY → ILLWATCH
10/10 au 15/10/2026	interface web, M8 clos, M9, M10 et M11 livrés
22/10 au 24/10/2026	site de présentation en 5 langues, demandes de démonstration
30/10/2026	inventaire en fichier, ponctuation, documentation v2.0
novembre 2026 (cible)	serveur européen, M7 et M11 clos, `v0.2.0`
